

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 101e006 of 101e008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.


Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0346-180425-06 Datum van het onderzoek : 25/04/2018
 Extra controle datums

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : TEKA TSASA
 SINT-BERNARDESESTEENWEG 854, 1ste verdiep
 2660 HOBOKEN

Visualisatie van de installatie

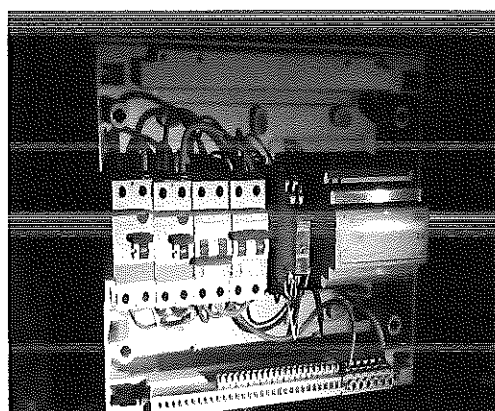

EIGENAAR : TEKA TSASA
Adres : SINT-BERNARDESESTEENWEG 854, 1ste verdiep
 2660 HOBOKEN

OPDRACHTGEVER : KONZAWRANE PLAN DE DIEU
Adres : FORT V-STRAAT 2b1
 2650 EDEGEM

INSTALLATEUR : KONZAWRANE PLAN DE DIEU
Adres : FORT V-STRAAT 2b1
 2650 EDEGEM

BTW of IK :

EAN : Teller nr. 33729848 Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe installatie /	Type der Lokalen :	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	maximum 40 A
Type van de aardelektrode:	Pennen	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	2	Aantal eindstroombanen :	9
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
 Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 9,8 Ohm RI tot 207 MOhm

BECONTROLEERD 25 APR 2018

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1. De keuken is nog niet geplaatst.
2. De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
3. De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
4. Geen droogkast aanwezig.
5. Dit verslag kan gebruikt worden voor verzwaaring.

GECONTROLEERD 25 APR 2018

Besluit De installatie is conform.
De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/04/2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0346 GERT FOBELETS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)


- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overtoornies en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffende gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

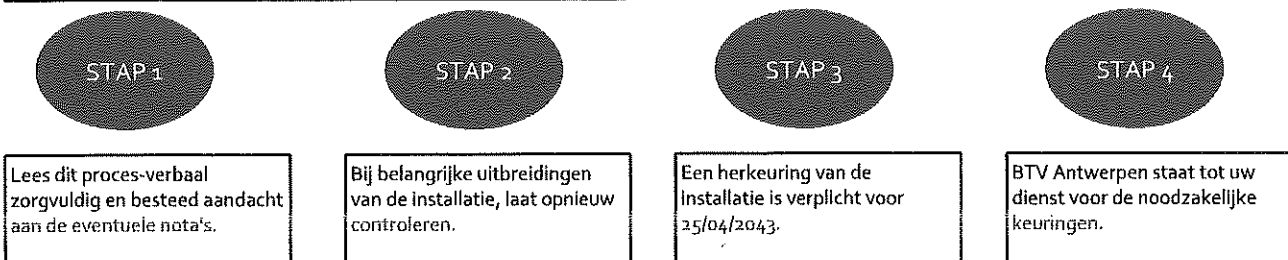




Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES VERRAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGINSTALLATIE

GECONTROLEERD 25 APR 2018

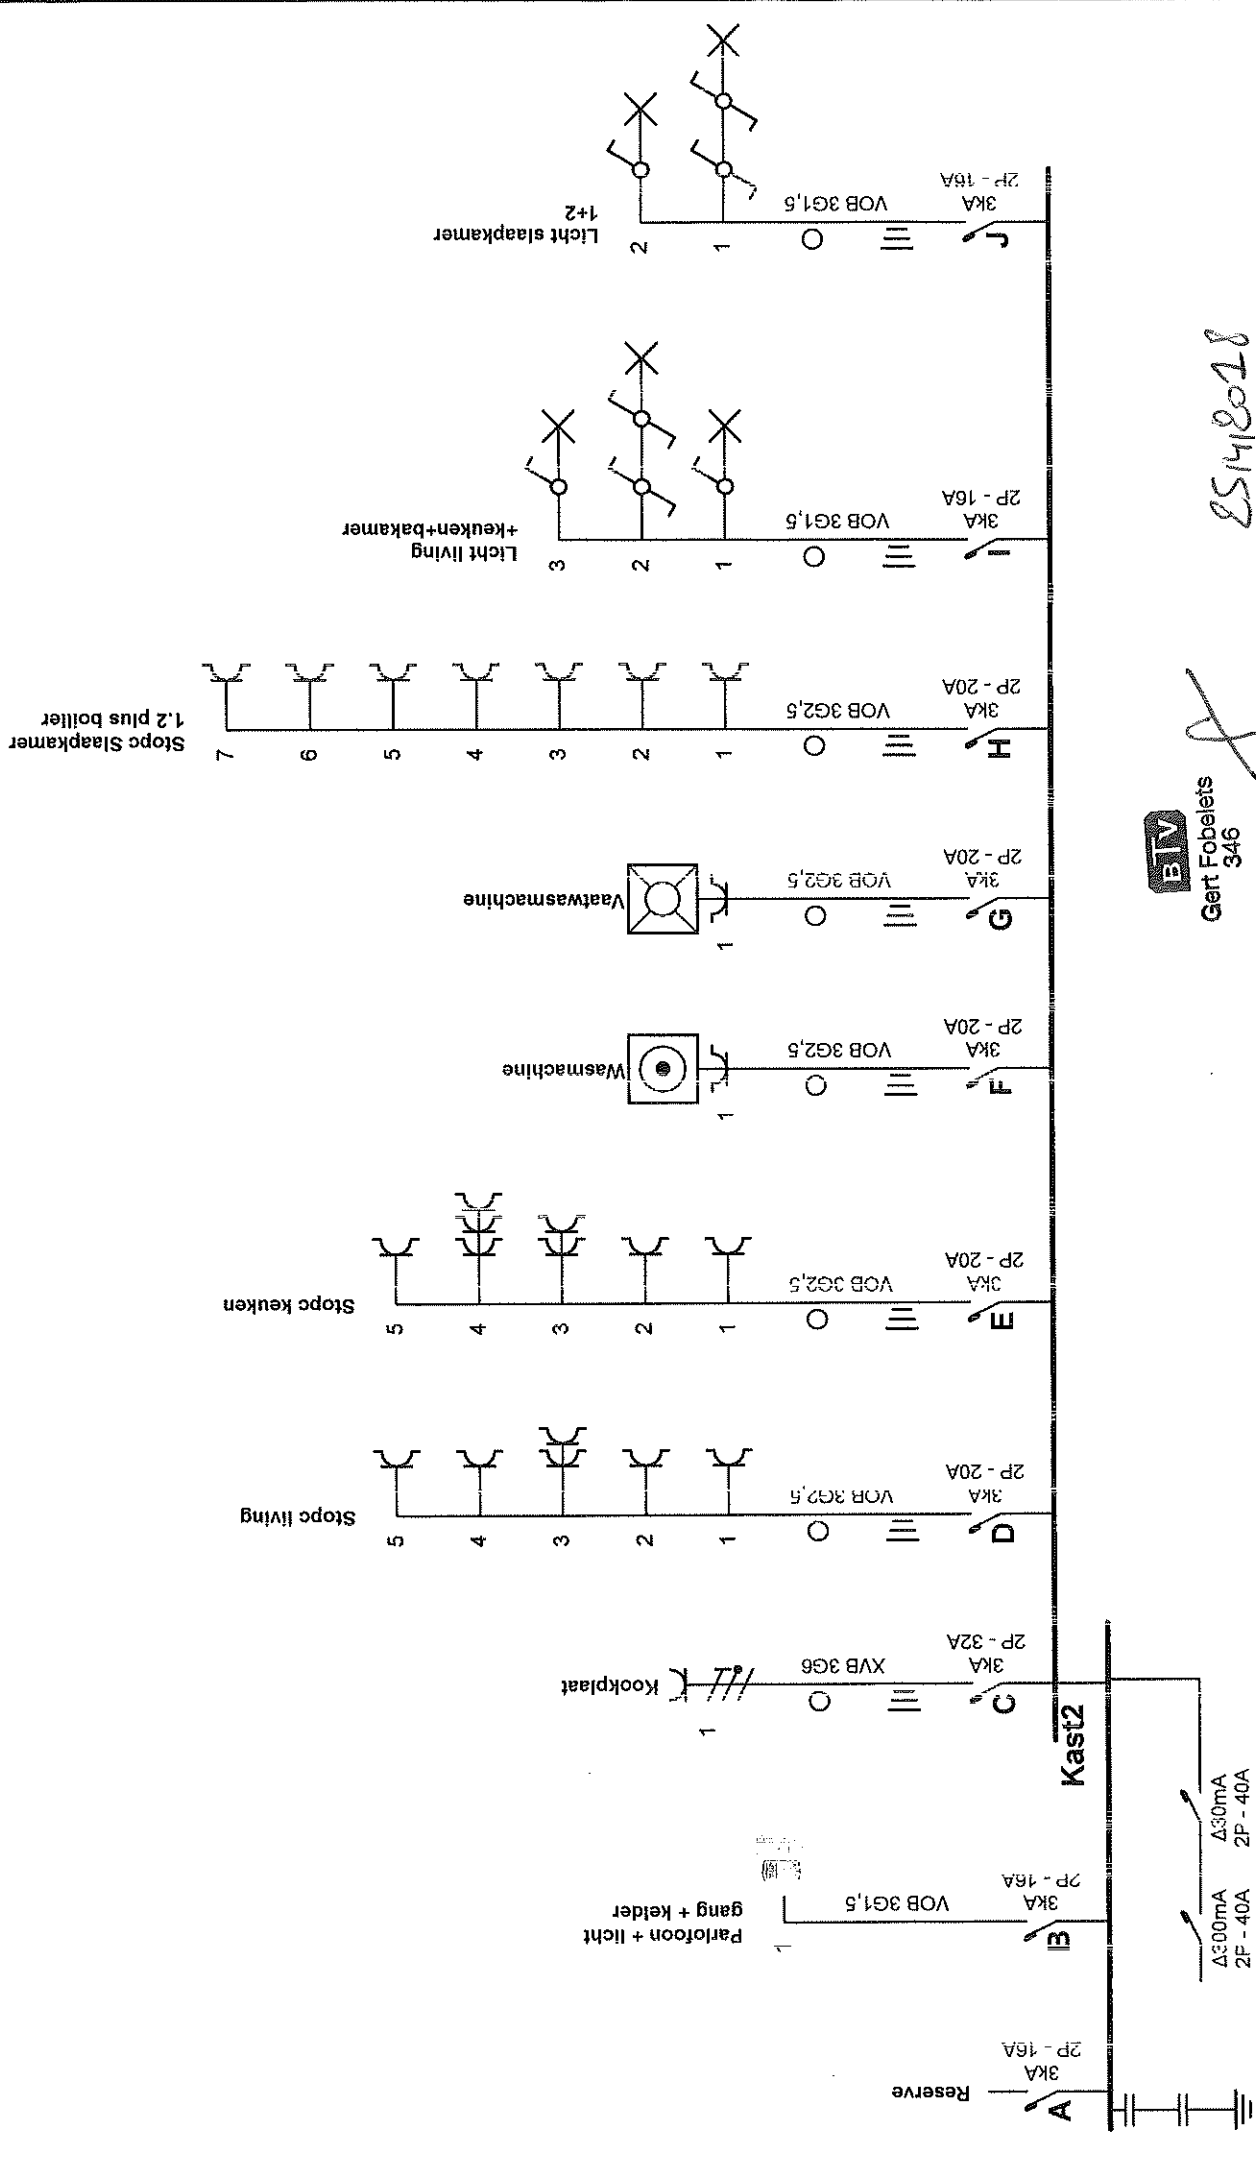


Gert Fobelets
346

25/11/2018

Plaats van de elektrische installatie TIEKA TSASA VIRGINIE SINT BER VARDSESTEENWEG 854 2660 HOEIOKEN GSM: 0493485692	Installateur Konzaivane Plan de Dieu Fort v Straat 2 2660 Edegem GSM: C488790488
	P. 1/3 Eendradschema Datum: 16-4-2018 2 x 230V ~ 50Hz

Schema's griekend door: H.P. Renova bvba - BTW BE 0479.630.393

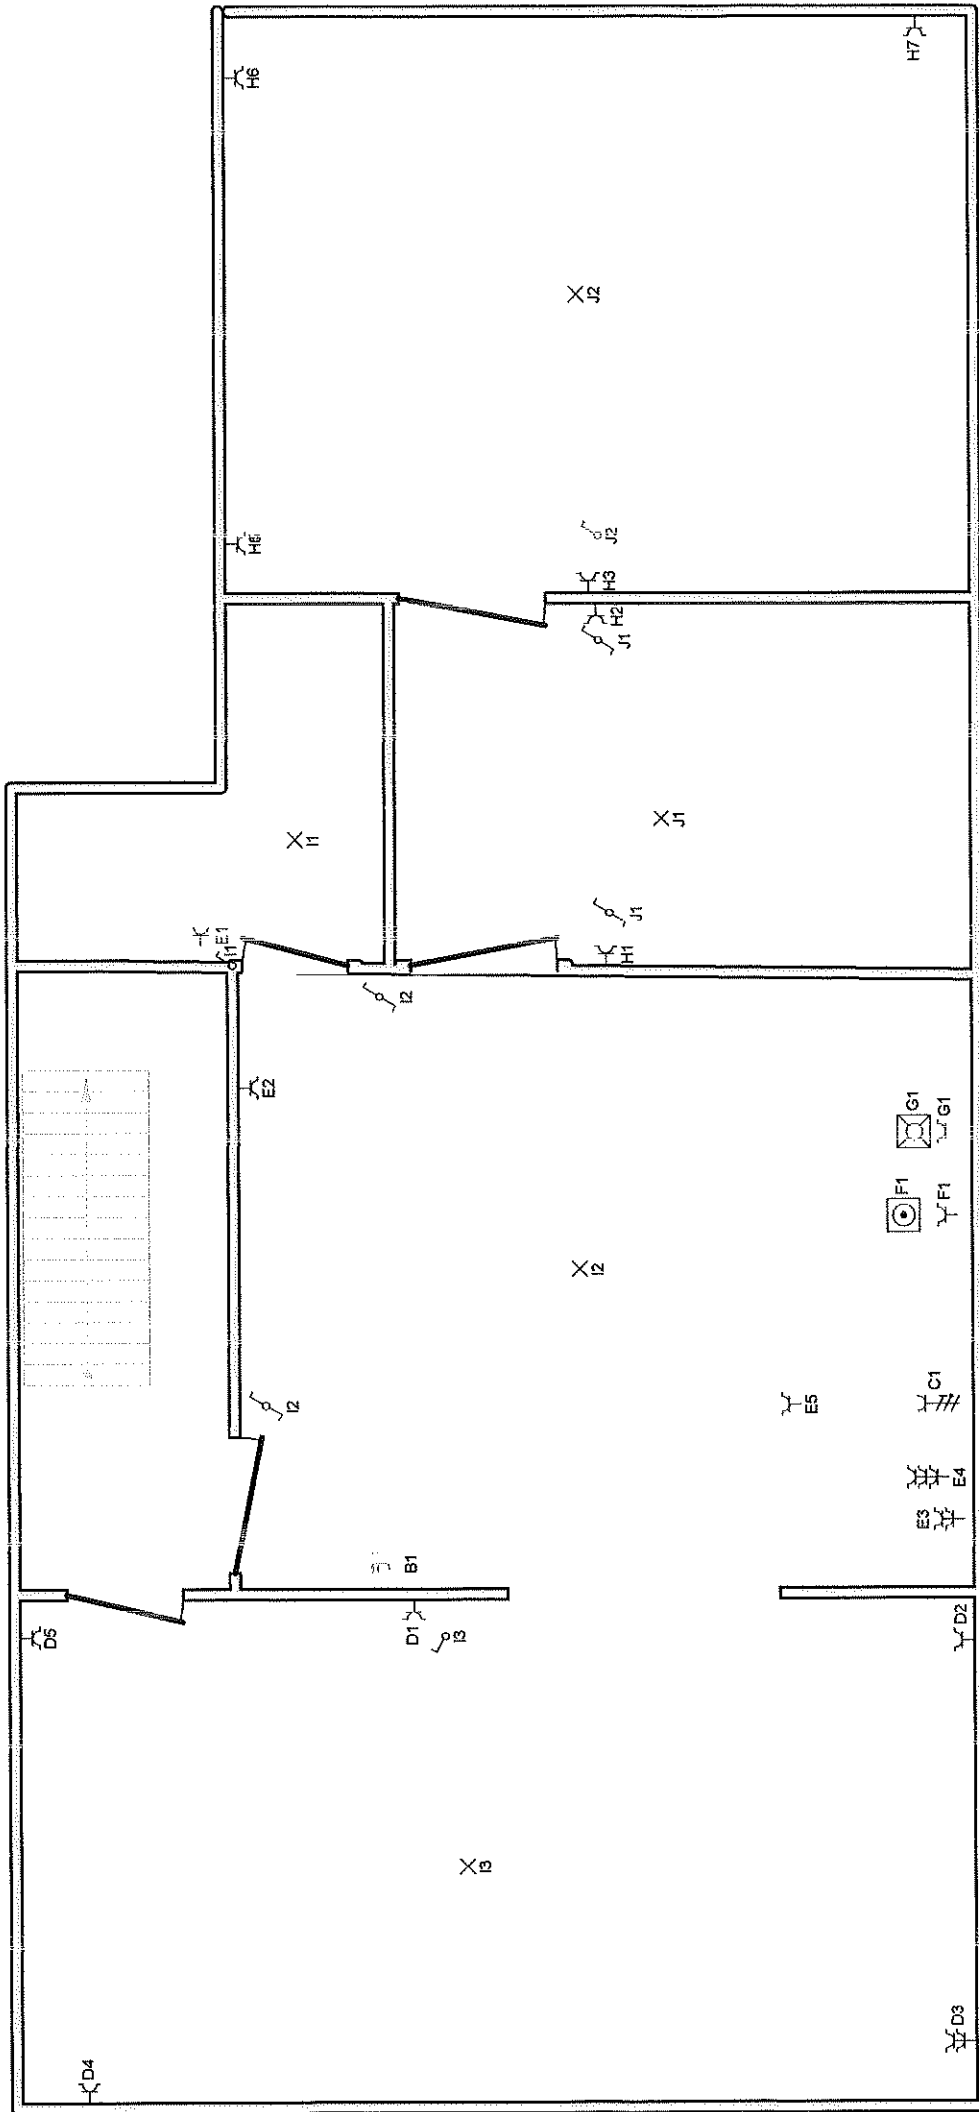

Gert Fobelets
346

<p>p. 2/3 Situatieschema</p>	<p>Installateur Konzwarne Plan de Dieu Fort v Straat 2 2650 Edegem GSM: 0488790488</p>
<p>Datum: 16-4-2018 2 x 230V ~ 50Hz</p>	<p>Plaats van de elektrische installatie TEKA TSASA VIRGINIE SINT BERNARDESESTEENWEG 854 2660 HOBOKEN GSM: 0493485692</p>
<p>Schema's getekend door: H.P. Renova byba - BTW BE 0479.830.393</p>	

- A Reserve
- B Perfofoon + licht gang + kelder
- Kast2**
- C Kookplaat
- D Stopc living
- E Stopc keuken
- F Wasmachine
- G Vaatwasmachine
- H Stopc Slaapkamer 1.2 plus boiler
- I Licht living +keuken+bakamer
- J Licht slaapkamer 1+2

Plaats van de elektrische installatie
 TEKA TSASA VIRGINIE
 SINT BERNARDESESTEENWEG 854
 2660 HOBOKEN
 GSM: 0493486692

Installateur
 Konzavrane Plan de Dieu
 Fort v Straat 2
 2650 Edegem
 GSM: 0488790488

p. 3/3
 Lijst Kringen
 Datum: 16-4-2018
 2 x 230V ~ 50Hz
